


Presentatie Fietsberaad


28 juni 2007

Margaret Raijmakers
Projectleider Vinex




Het proces van de VINEX

Het creatieve proces coördineren
en sturen




Inhoud

- Projectmatig werken
- Projectorganisatie
- Basisdocumenten
- Succesfactoren Houten




Projectmatig werken (kenmerken)

- planmatig ipv routinematig
- gestructureerd en gefaseerd
(projectplan; vooraf nadenken; tgkio)
- tijdelijk en uniek → gerelateerd aan het project
- resultaatgericht (product staat voorop, niet de personen)
- integraal




Van belang voor projectmatig werken

- a. Eenduidige en organisatiebreed gedragen wijze van projectmatig werken
- b. Voldoende (politiek) draagvlak voor project
- c. Krachtvolle opdrachtgevers (ambtelijk/bestuurlijk), die bewust zijn van hun rol
- d. Capabele opdrachtnemer/projectleider
- e. Evenwichtige samenstelling projectgroep
- f. Duidelijke en gedragen projectopdracht
- g. Duidelijkheid vooraf (bij projectstart) over taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden
- h. Voldoende budget




Organisatie Vinex

- Regie ligt i.p. bij gemeente (bouwclaim; zelfrealisatie)
- Opdrachtgeverschap (best/ambt)
- Projectleider van POW
- Externe ontwerpdisciplines (4), interne beleidsdisciplines
- Ontwerpteam (deelplanoverstijgend)
- Projectgroepen

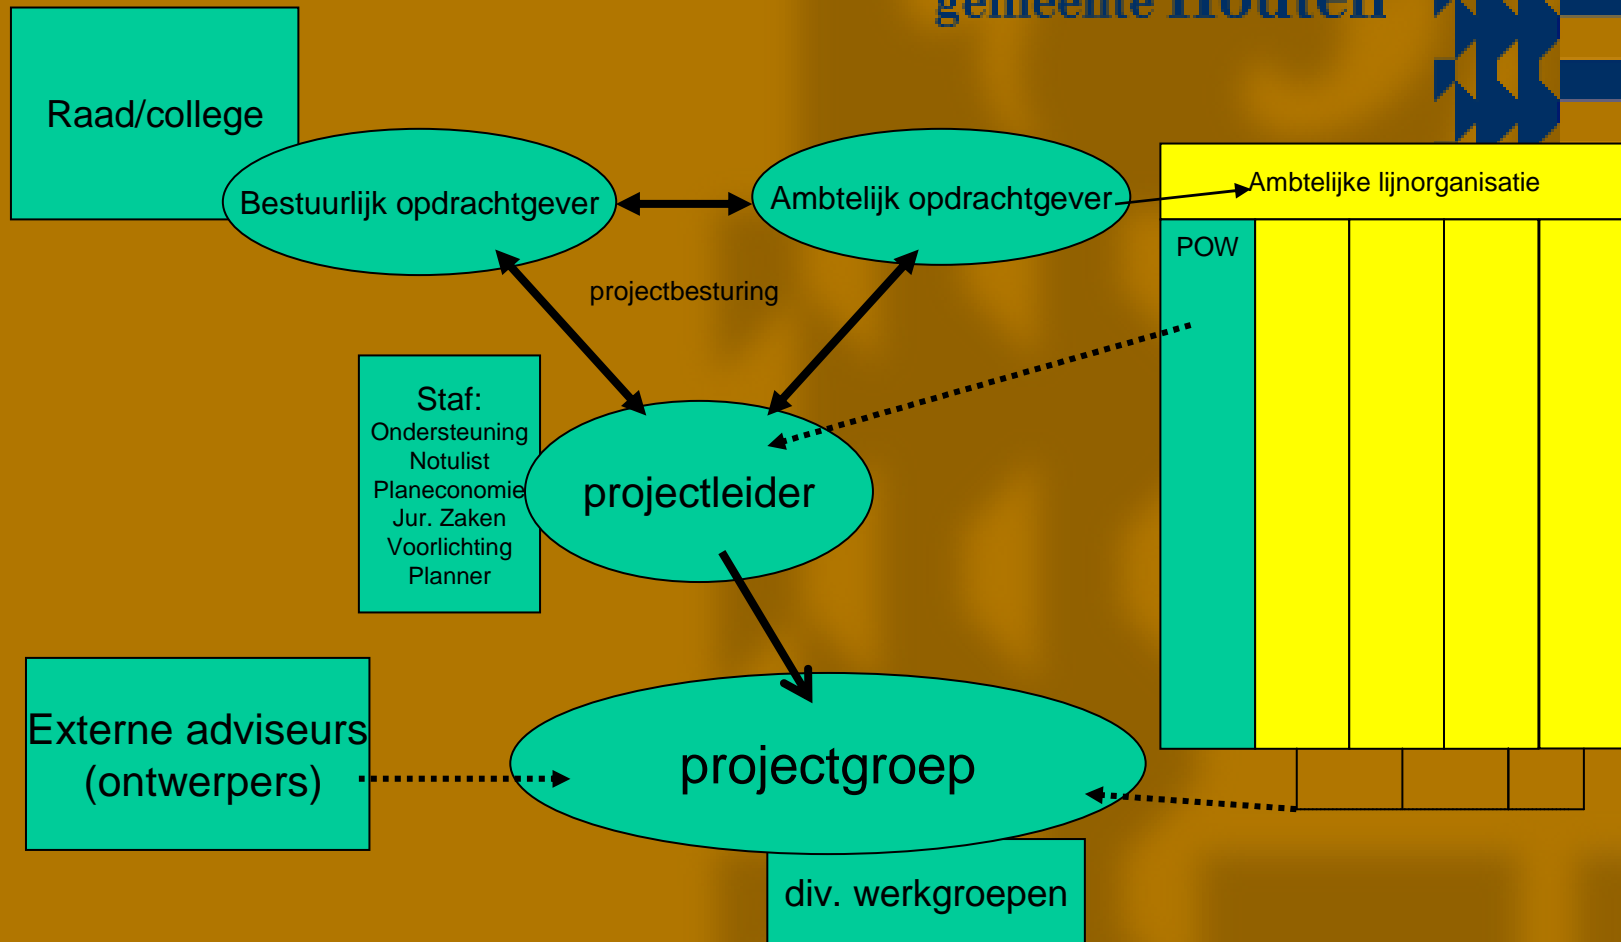


Projectorganisatie in Houten



Projectleider

- Verantwoordelijk voor project (tgkio)
- Aansturing projectgroep (organiseren, communiceren, stimuleren, motiveren, knopen doorhakken)
- Bewaker van relatie lijn/project
- Adviseur ambtelijk/bestuurlijk opdrachtgever




Basisdocumenten Vinex

- Structuurmodel
- Raamwerk (evenwichtige projectie voorzieningen)
- Facetplannen → IPvE (met actualiseringen)
- Handboek Openbare Ruimte (profielen; bestek)
- Procesbeschrijving: projectplan en activiteitenoverzichten (draaiboek)
- Grex



Succesfactoren Houten


- Projectmatige aanpak
- Strakke organisatie en goede procesbeschrijving
- Korte lijnen met bestuur
- Brede vertegenwoordiging (ontwerp)disciplines
- Continuïteit en evenwichtigheid in samenstelling van de pg
- Integraliteit (denken en handelen)
- Gezonde financiële huishouding
- Vasthouden aan basisprincipes



Verkeersveiligheid in Houten


Herbert Tiemens

Beleidsmedewerker Verkeer en
Vervoer





Verkeersveiligheid

- Houten koppelt een hoog fietsgebruik aan een hoge verkeersveiligheid
- Groeigemeente leidt tot moderne, duurzaam veilige, weginrichting




Provinciale vergelijking

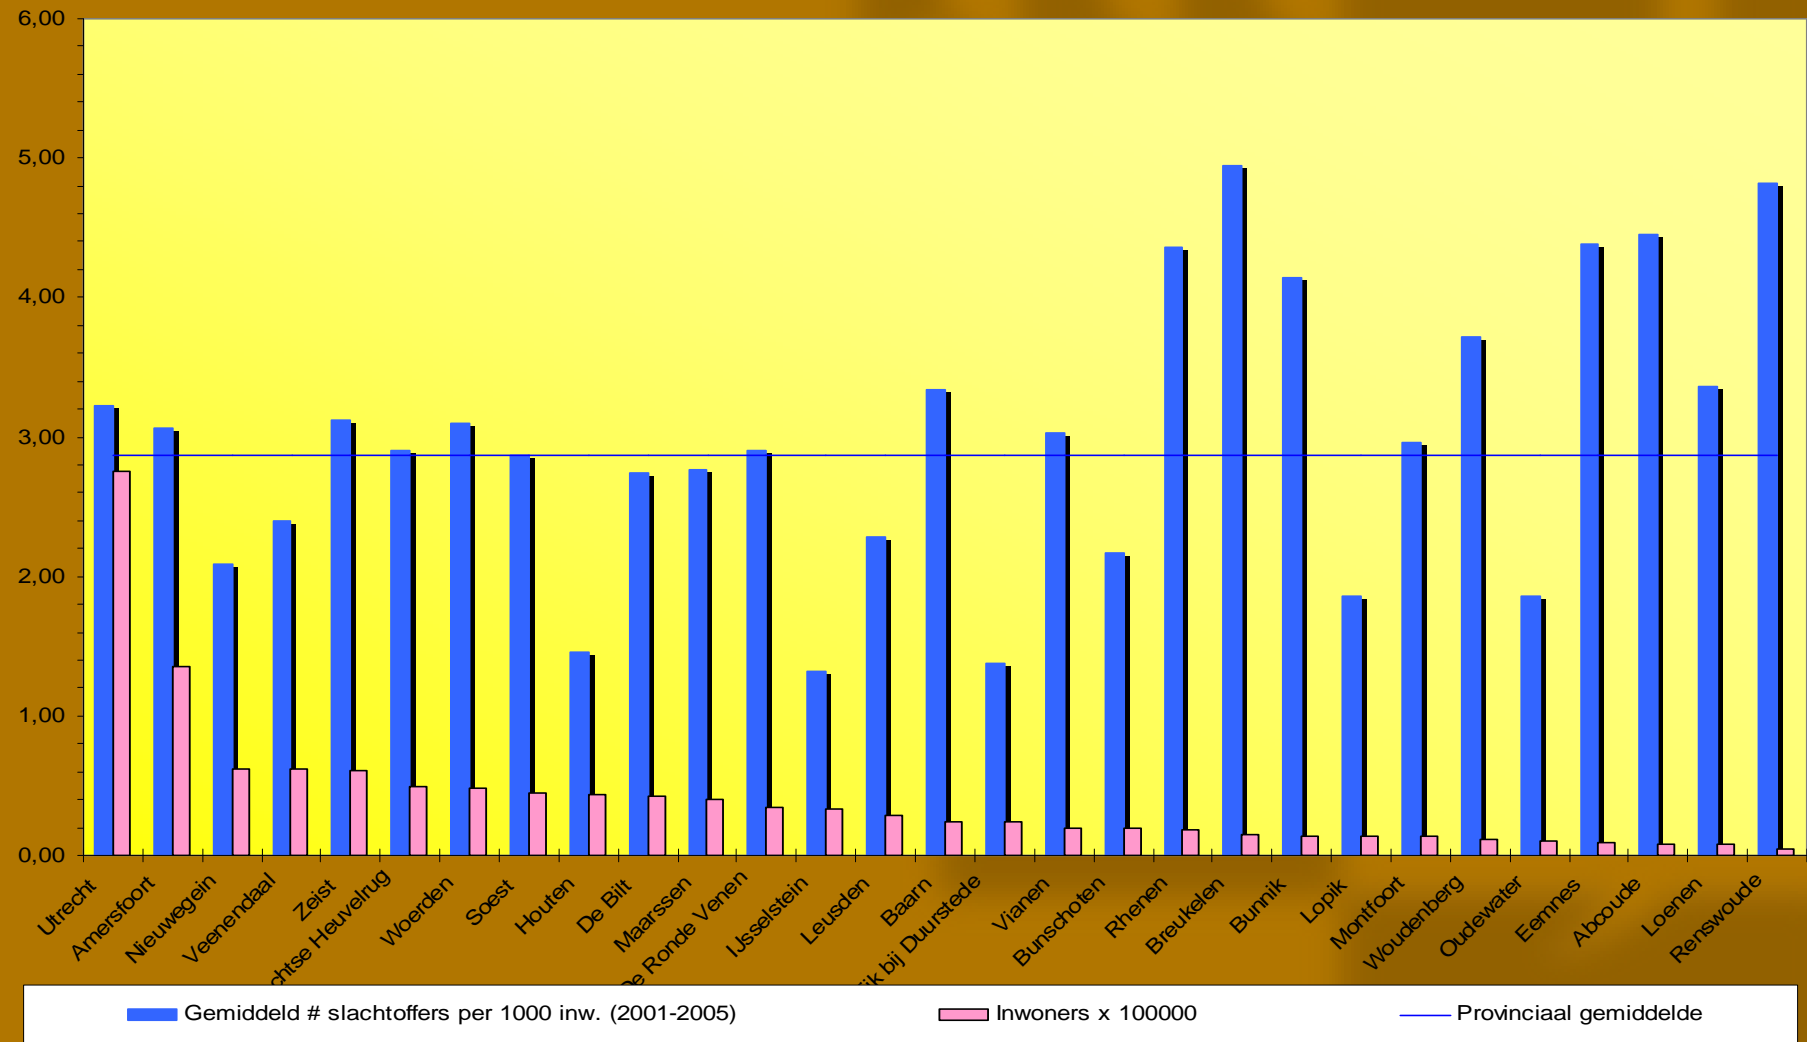




Verkeersveiligheid

- Ernstige ongevallen voornamelijk op Rondweg
- Enkele specifieke locaties in Centrum
- Onderregistratie (eenzijdige) fietsongevallen

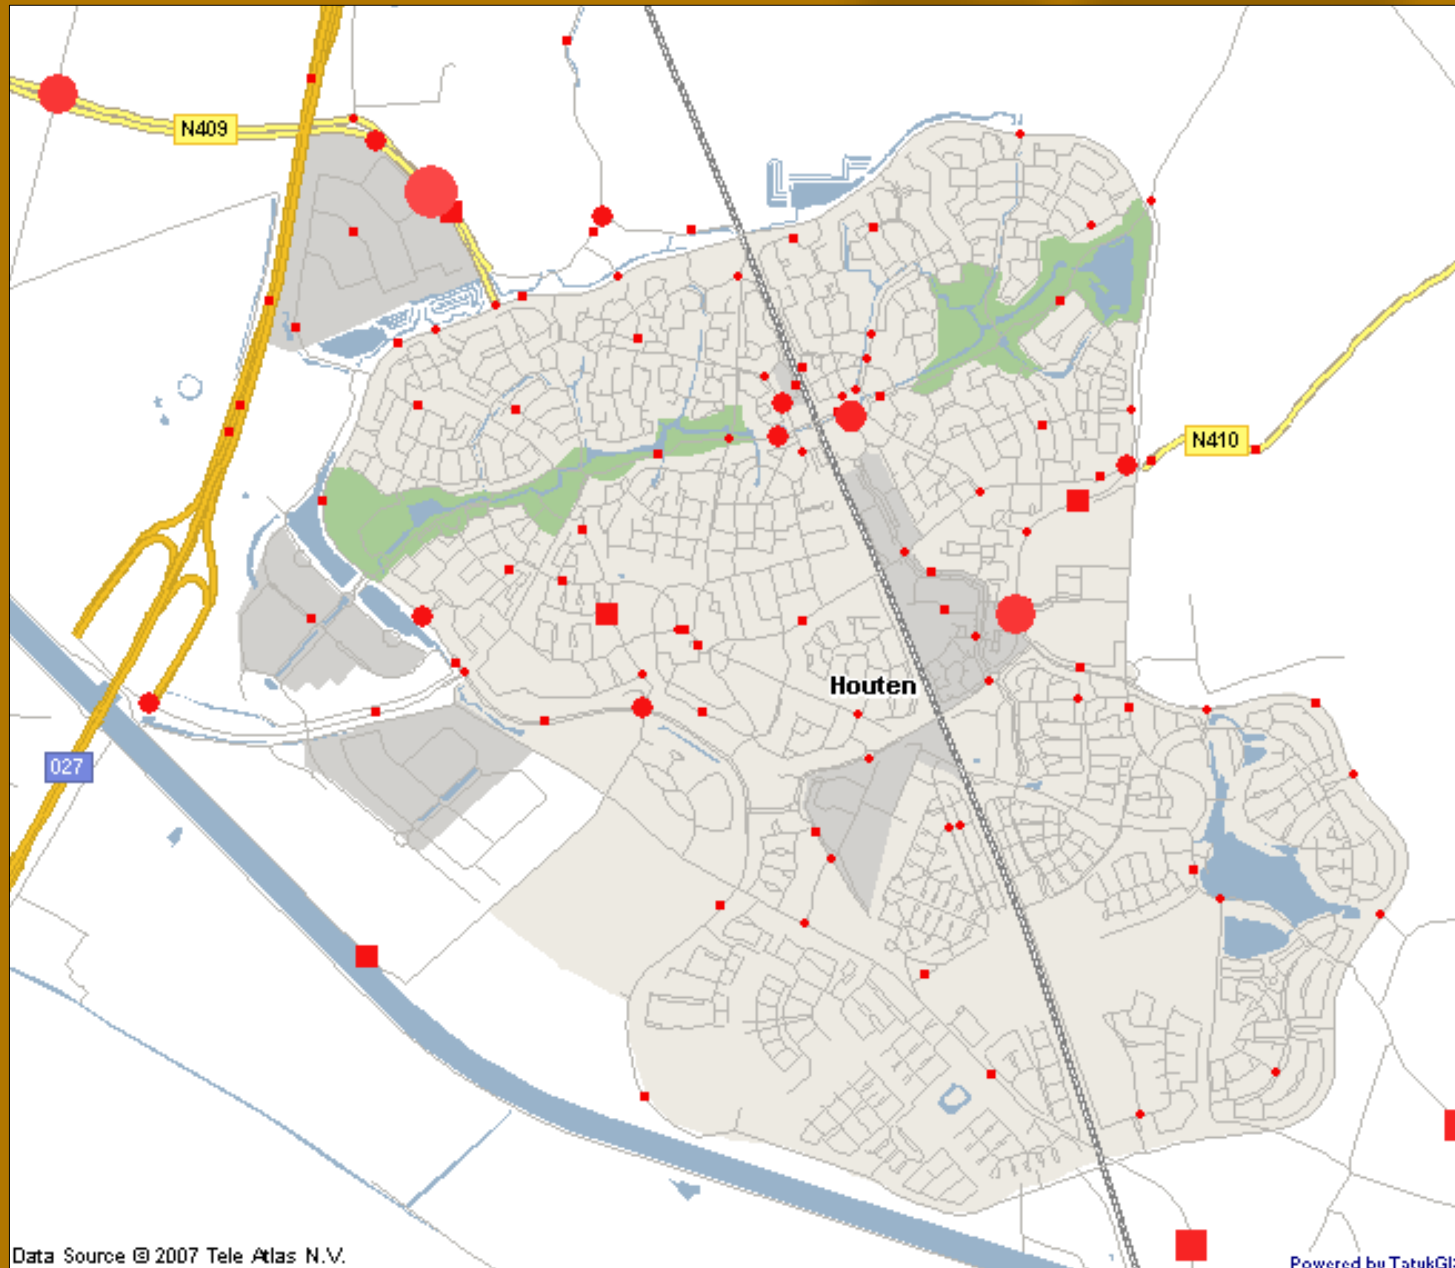




Bromfietsoverlast

- Bromfiets niet over Rondweg (70 km/u) + handhaafbaarheid
- Bromdremfels bij attentiepunten, plaatselijke snelheidsverlaging, beperken discomfort fietser






Oriëntatie

- Bochtige fietsstructuur en veel groen leiden tot desoriëntatie
- Straatnaamgeving geënt op autoverkeer






Comfort en Hinder


- Paaltjes op fietspaden, nodig in opstartfase
- Bij reconstructie herzien of paaltjes nodig blijven






Routes buiten de bebouwde kom


- Verwachtingspatroon verkeersveiligheid van Houten wordt op buitengebied geprojecteerd

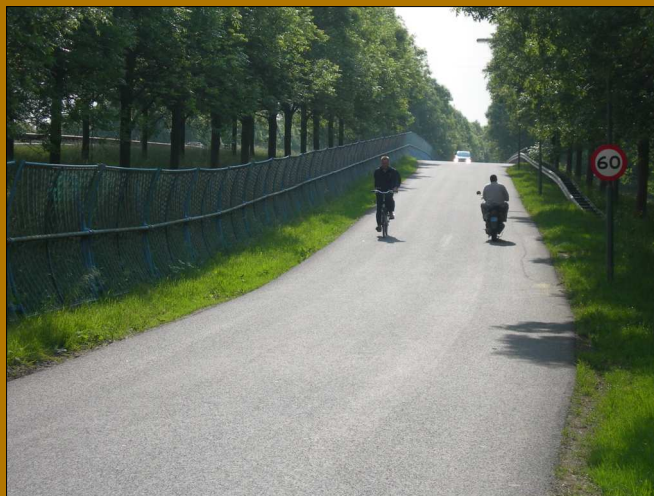




Fietsendiefstal in stationsomgeving

- Bij planning onverwacht succes van combinatie Fiets + Trein
- Veel diefstalgevoelige locaties
- Preventieproject: afname > 25%




- Tijdens de verbouwing gaat het Centrum door





Fietstransferium





Fietstransferium

